



REGIO DEAL
ZEEUWS-VLAANDEREN
SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN BETER EN STERKER ZEELAND
ECONOMIC
BOARD ZEELAND
SAMEN ZEELAND IN STROOMVERSNELLING HOUDEN

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
Telefoon: 14 0115
Vanuit buitenland: +31 115 455 000
E-mail : gemeente@terneuzen.nl
Internet: www.terneuzen.nl

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en
zaaknummer van deze brief vermelden.

Provincie Zeeland
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

uw brief van :
uw kenmerk :
zaaknummer : 153643
contactpersoon :
telefoon :
e-mail :
verzonden :

21 JAN 2022

Terneuzen, 21 december 2021

Onderwerp: voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwen zelf aan zet.

Geacht College,

Kort geleden verzonden wij een brief naar de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'. De brief aan de minister zenden wij u bij deze ter kennisname toe, zodat u eveneens kennis kan nemen van de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal.

Samengevat bevat de brief de volgende informatie:

- In de periode maart-september 2021 zijn alle projecten van start gegaan, waarmee het gros van de Regio Deal middelen is toegekend aan de in het programma opgenomen projecten
- Het onderdeel participatie komt goed van de grond komt. Met name binnen lijn 2 'Toekomstig veranderen leefomgeving' is dit goed zichtbaar. Deze projecten dienen weer als voorbeeld voor de andere projecten en laten zien welke rol de inwoners kunnen hebben bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving
- De initiatiefnemer van Max Mobiel heeft besloten om het concept niet verder in te voeren. Uit het eerste fase onderzoek naar de grensoverschrijdende vervoersbehoeften blijkt dat de vraag naar grensoverschrijdend vervoer te laag is
- In overleg met de partners van de deal gaan wij daarom op zoek naar projecten met gelijke doelen, om zo alsnog aan de afspraken van de Regio Deal te voldoen

De voortgang van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen is daarmee goed te noemen. De verwachting is dat zowel inhoudelijk als financieel gezien aan de voorwaarden van de Regio Deal wordt voldaan (aan het einde van de looptijd). We blijven met het Rijk in nauw overleg over de resultaten van de deal.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

burgemeester.

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer



REGIO DEAL
ZEEUWS-VLAANDEREN
SAMEN AAN DE SLAG VOOR EEN BETER EN STERKER ZEEF AAN
ECONOMIC
BOARD ZEELAND
SAMEN ZEELAND IN STROOMVERSHELLING HOUDEN

Postadres: Postbus 35, 4530 AA Terneuzen
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen
Telefoon: 14 0115
Vanuit buitenland: +31 115 455 000
E-mail : gemeente@terneuzen.nl
Internet: www.terneuzen.nl

Bij beantwoording a.u.b. onderwerp, datum en zaaknummer van deze brief vermelden.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC DEN HAAG

uw brief van :
uw kenmerk :
zaaknummer : 153643
contactpersoon :
telefoon :
e-mail :
verzonden :

21 JAN 2022

Terneuzen, 21 december 2021

Onderwerp: voortgangsrapportage Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen

Geachte

Vanaf juli 2020 zijn Rijk en regio samen aan de slag met het programma 'Zeeuwen zelf aan zet'. Dit hebben we bekrachtigd in de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'. Vanuit de regio wordt twee keer per jaar de voortgang gemonitord. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode tot en met 30 september 2021.

In de periode september 2020 tot en met maart 2021 waren we met name bezig met de opzet van het programma 'Zeeuwen zelf aan zet'. Acht projecten waren van start en de overige projecten uit de Regio Deal stonden in de startblokken. Daarnaast waren de voorbereidingen begonnen voor een monitoringsplan en nulmeting. Ten slotte keken we vooruit. De verwachting was dat het programma dan in volle bloei zou zijn en dat het onderdeel participatie een prominente rol had gekregen binnen het programma.

Terugkijkend op deze periode, kunnen we concluderen dat het programma inderdaad in volle bloei is en dat participatie een belangrijke rol heeft gekregen binnen onze werkzaamheden. In de periode maart-september 2021 zijn alle projecten van start gegaan, waarmee het gros van de Regio Deal middelen is toegekend aan de in het programma opgenomen projecten. Wel kan worden geconcludeerd dat de projecten de tijd nodig hebben gehad om zaken verder vorm en inhoud te geven. Omdat drie projecten meer tijd nodig hadden voor een definitieve project opzet, hebben deze projecten een startsubsidie ontvangen. Na een go/no-go-moment krijgen zij een vervolgbeschikking.

Het is goed om te kunnen constateren dat het onderdeel participatie van de grond komt. Met name binnen lijn 2 'Toekomstig veranderen leefomgeving' is dit goed zichtbaar. Zo ontstaat in de gemeente Hulst een regionaal netwerk van inwoners die gezamenlijk aan de slag gaan met de fysieke leefomgeving. Dit zelfde gebeurt ook in Wemeldinge (gemeente Kapelle). Daarnaast zijn er in Aagtekerke (gemeente Veere) een aantal enthousiaste inwoners aan de slag binnen het buurthuis. Deze projecten dienen weer als voorbeeld voor de andere projecten en laten zien welke rol de inwoners kunnen hebben bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving.

Vanuit het programmabureau en de lijnprojectleiders is verder geïnvesteerd in kennisdeling en samenwerking, wat een belangrijk onderdeel is van de Regio Deal. De inzet is nu om lijn overstijgend kennis te gaan delen. Enerzijds op het onderdeel van de participatie, anderzijds worden projecten uit verschillende lijnen aan elkaar gekoppeld. Via deze koppelingen verbinden we gelijke initiatieven met elkaar. Helaas zien we met de huidige situatie rondom corona beperkingen ontstaan door het wegvallen van de mogelijkheden elkaar fysiek te treffen.

Naast de succesverhalen hebben we ook een aantal projecten in de Regio Deal waar we extra aandacht aan moeten besteden. Helaas heeft de initiatiefnemer van Max Mobiel besloten om het concept niet verder in te voeren. Uit het eerste fase onderzoek naar de grensoverschrijdende vervoersbehoeften blijkt dat de vraag naar grensoverschrijdend vervoer te laag is. De afgelopen periode heeft de vraag drastisch gewijzigd. Corona lijkt hier mede debet aan.

Bovenstaande houdt in dat een gedeelte van de gereserveerde middelen beschikbaar is binnen de Regio Deal. In overleg met de partners van de deal gaan wij daarom op zoek naar projecten met gelijke doelen, om zo alsnog aan de afspraken van de Regio Deal te voldoen. We informeren u begin februari 2022 over de uitkomsten van onze zoektocht.

Ten slotte kijken we met goed gevoel terug op de gezamenlijke bijeenkomst op 7 oktober jongstleden. Deze inspirerende en interactieve dag stond vol voorbeelden over hoe bestuurders, ondernemers en inwoners zelf aan de slag zijn gegaan met belangrijke regionale opgaven, welke oplossingen zij aandragen voor de toekomst en hoe zij brede welvaart in hun regio daarmee voortdurend helpen groeien. Deze dag heeft nieuwe inzichten opgeleverd waarmee Rijk en regio dit doel verder kunnen versterken. We hopen u volgend jaar nog meer resultaten van de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen te kunnen laten zien. We nodigen u dan ook van harte uit om gezamenlijk met bewoners, ondernemers, bestuurders en collega's van andere ministeries te bekijken hoe we elkaar kunnen versterken in de opgaven waar wij als regio en u als Rijk voor staan.

Alles overziend zijn wij positief over de voortgang van de projecten in de deal. De verwachte voortgang op de projecten loopt volgens planning en de besteding van middelen zal vlug volgen. Daarop verwachten we wel een inhaalslag nu nagenoeg alle projecten uit de opstartfase komen. Ook ten aanzien van de gemaakte afspraken op de cofinanciering loopt alles nog volgens planning. In de bijlagen bij deze brief hebben we overzichten toegevoegd die deze voortgang inzichtelijk maken. De komende periode verwachten we meer duidelijkheid te krijgen op een aantal projecten ten aanzien van go/no-go-moment en de opvolging daarvan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

gemeentesecretaris,

burgemeester,

J.G. (Jan) Princen

H.J.A. (Erik) van Merrienboer

		Stand van zaken project	Voortgang prestatieafspraken	Korte stand van zaken	Financiële voortgang	Planning rest looptijd	Risico's	Successen	RD middelen	Toegekende RD bijdrage	Afspraken
Identiteit en Participatie											
1.	Iedereen telt										
a.	MAEX platform	Opstartfase.	Een platform brengt de maatschappelijke dynamiek in beeld. Het platform krijgt functionaliteiten die de maatschappelijke impact in beeld brengen, de bovenlokale kennisuitwisseling vergroten en de maatschappelijke beurs versterken.	Op dit moment wordt met name geïnvesteerd in draagvlak en in de ontwikkeling van een agenda voor 2022.	De financiële voortgang loopt ligt achter op de planning.	Conform planning.	Draagvlak creëren blijft essentieel. Hiervoor wordt geïnvesteerd in: een serie die wordt uitgezonden op Omroep Zeeland, de afspraken/agenda voor MAEX Zeeland 2022 en de MAEX Zeeland impuls waarmee een fonds wordt gevormd voor kansrijke initiatieven.	Voor MAEX Zeeland zijn kennismakingssessies met initiatiefnemers door ZB georganiseerd. Op basis van deze sessies is een aantal kennissessies in voorbereiding. Geïnvesteerd is in de inzet van ZB voor de doorontwikkeling van MAEX Zeeland.	€ 60.000	€ 60.000	
b.	Eindgebruikersaanpak	In uitvoering.	Door middel van inwonersparticipatie worden drie projecten gerealiseerd voor verbetering van de leefomgeving in Zeeland, waarvan de ideeën zijn uitgewerkt op basis van het concept design thinking.	Het initiatief busstation Terneuzen is in gevorderd stadium, de andere twee initiatieven worden voorbereid.	De financiële voortgang loopt ligt achter op de planning.	Conform planning.	Tot op heden beperkt.	Voor wat betreft de wachtbeleving op het busstation Westerscheldetunnel Terneuzen is de grondschildering die samen met studenten is ontwikkeld in de zomerperiode aangebracht. Met de studenten van de opleiding mediavormgeving van Scaldia is een huisstijl voor de bebording gemaakt. De studenten zullen gedurende de looptijd van de Regio Deal een aantal keren de borden verwisselen. We hopen dat deze samenwerking de komende periode kan uitbreiden. In samenwerking met de gemeente Terneuzen zijn inmiddels twee Haltehelden ingehuurd. De beide dames zijn opgenomen in het team van Stadservice Terneuzen.	€ 190.000	€ 190.000	
2.	Participatieplatform	Opstartfase.	- Minimaal één inwonerspanel is opgezet. - Eén uitwisselings- en leerplatform voor inwonersparticipatie.	Hiervoor is de eerste stap om een gezamenlijk 'Zeeuws breed' proces in te zetten om een platform te ontwikkelen. De gesprekken hiervoor zijn gestart in samspraak met de projecten uit de Regio Deal en de ZB.	Er zijn nog geen middelen besteed.	Het project loopt ligt achter op planning: een platform neerzetten is één, een gezamenlijk platform neerzetten heeft meerwaarde, deze gezamenlijke opzet kost tijd.	In deze opstartfase worden tal van risico's voorzien, zoals geen aansluiting op de inwoners, opzetten samenwerking en het groot aantal bestaande initiatieven. De komende periode wordt daarom gebruikt om deze zaken nauwkeurig te inventariseren en wensen van partijen in kaart te brengen.	In ZB is een partner gevonden om het platform ontwikkelingsgericht op te zetten.	€ 10.000	€ 40.000	
Toekomstbestendig veranderen leefomgeving									€ 260.000	€ 290.000	
3.	Versterk de Scheldekust	In uitvoering.	- Aanleg route voor landschapsbeleving langs de Schelde. - Per dorp is een projectplan voor daadwerkelijke realisatie van de gewenste voorzieningen opgesteld en uitgevoerd door en met inwoners.	De eerste bijeenkomsten met burgers hebben plaatsgevonden. De komende tijd wordt met werkgroepen aan de slag gegaan richting uitvoering. Zo wordt de bebording opgepakt met de werkgroepen en uitgerold in de dorpen.	Conform planning. De komende periode wordt met name beroep gedaan op de middelen uit de Regio Deal.	De planning is een uitdaging. De uitvoeringsperiode van de Regio Deal is kort gezien de fysieke ingrepen (vergunningen en medewerking partners) die plaats moeten vinden. Dit komt mede door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen.	Participatietrajecten kunnen ook leiden tot weerstand. Hierdoor kost het maken van een definitief ontwerp voor fysieke ingrepen soms meer tijd dan gepland. Krevershille is hiervan een voorbeeld.	Versterk de Scheldekust is een project waarbij de samenwerking tussen de gemeente Hulst, Grenspark Groot Saefthinghe, de bewoners van de dorpen en de streek centraal staat. In maart en april 2021 zijn we gestart met het participatieproces als vervolg op de gebiedsconsultatie van de jaren daarvoor. Op deze manier hebben inwoners en andere betrokkenen actief mee kunnen denken. De feedback (in de vorm van opmerkingen, reacties en mentimeterresultaten) is verwerkt in de definitieve schetsontwerpen die hiermee verder zijn verfijnd en teruggekoppeld aan de werkgroepen en gedeeld via het platform. Met die ontwerpen in de hand kan de volgende stap worden gezet: het realiseren van een aantal onderdelen van het project. De uitvoering gaat in stappen en samen met werkgroepen uit de Schelgedorpen. Alle streekholders blijven betrokken via het grensparkplatform. Stap voor stap rollen we de rode loper langs de kust op deze manier uit.	€ 500.000	€ 500.000	

4. Lokale deal Wemeldinge	In uitvoering	Aanleg route voor landschapsbeleving langs de Schelde.	In overleg met stakeholders is een masterplan ontwikkeld waar de belevingsroute onderdeel vanuit maakt. Na vaststelling op 19 oktober wordt overgegaan op realisatie van het masterplan en de uitvoeringsagenda. Ok hier worden inwoners betrokken door middel van overleg tafels.	Conform planning. De komende periode wordt met name beroep gedaan op de middelen uit de Regio Deal.	Conform planning	n.v.t.	In een stakeholdersmeetings is onder meer gepolst hoe men aankijkt tegen een interactieve belevingsroute en of er een breed draagvlak is om een dergelijke route te realiseren, ook in samenwerking met de stakeholders. Er zal onder meer voor deze activiteit een dialoogtafel opgezet worden, om de stakeholders ook goed te betrekken. Het Integraal Masterplan en de uitvoeringsagenda zijn ter besluitvorming aan de raad voorgelegd en vastgesteld. Er wordt nu gestart met de uitvoering. Trots is men op het participatietraject. Dit heeft mede geleid tot het succes en de betrokken inwoners willen ook betrokken blijven bij het vervolg. Dit wordt vormgegeven door middel van drie overlegtafels (interactieve belevingsroute, speelvoorziening Wemeldinge en Herinrichting boulevard).	€ 200.000	€ 200.000	De uitbreiding van het project met een getijdenbak in de Oosterschelde is een mooie toevoeging. Er wordt geen aanleiding hierin gezien om de beschikking te wijzigen. Het levert mogelijk wel meer cofinanciering op.
5. Lokale deal Aagtekerke	In uitvoering	Eén pilot in Aagtekerke is gerealiseerd, waarbij minimaal één maatschappelijke voorziening duurzaam in stand wordt gehouden door middel van burgerinitiatief.	Een eerste belangrijke stap is gezet. Inwoners hebben zelf het initiatief genomen om het dorpshuis in stand te houden. Focus is nu op de aanbestedingen van een nieuw dorpshuis en verplaatsing van de speeltuin. Ook moeten de innovatieve vormen van burgerinitiatieven worden uitgewerkt.	Door trage aanbesteding lopen de uitgaven achter. De scope van het project is echter niet gewijzigd.	De planning is krap mede door de drukte en slechte beschikbaarheid van materialen in de bouw. Dit heeft mogelijk effect op de kostprijs en de doorlooptijd van de besluitvorming. Voorlopig is de planning haalbaar.	zie planning	De wijze van samenwerken tussen de verschillende belangengroepen is een voorbeeld voor andere kernen/ontwikkelingen. Het plan wordt breed gedragen vanuit de bevolking. Er is sprake van een succesvolle samenwerking werkgroep met gemeente en ook onderling in de werkgroep van inwoners, potentiële beheerders, dorpsraad en verenigingen. Afstemming met speeltuinvereniging gaat voorspoedig waarbij ook kansen voor subsidies en samenwerking met dorpshuis goed onderzocht worden.	€ 250.000	€ 250.000	De eerstvolgende bijeenkomst van lijn 2 vindt plaats op locatie in Aagtekerke
6. Lokale deal Terneuzen	In uitvoering.		De lokale deal Terneuzen kent een groot aantal projecten. De focus vanaf april 2021 lag op het inrichten van de projectorganisatie. De onderdelen binnen het thema toepassen verbeteren fysieke leefomgeving/fysieke projecten zijn inmiddels gestart. Voor het onderdeel platform voor bewoners en organisaties worden contacten gelegd met de overige projecten uit de lijn.	Voor de projecten Visie Binnenstad, Vergroening Binnenstad, Saspepoort en Icoon geldt dat deze vooralsnog volgens planning verlopen. Doordat een deel van de projecten nog op gang moet komen, aangezien deze pas van start konden na positieve besluitvorming over de lokale deal, blijven de kosten op dit moment nog wat achter. De verwachting is dat dit in de komende maanden wordt inelonen.	Conform planning.	Het verdere verloop van de coronacrisis kan een belemmeringen vormen voor de organisatie van activiteiten, m.n. voor het organiseren van fysieke opleidingen/trainingen en bijeenkomsten.	-	€ 850.000	€ 850.000	Samen optrekken in het opzetten van de projectorganisatie.
7. Vernieuwing landbouw	Opstartfase.	- Een grensoverschrijdende innovatieregeling die boeren, ontwerpers en andere ondernemers samenbrengt binnen het Grenspark en hen stimuleert met actuele opgaven aan de slag te gaan. Gewerkt wordt aan creatieve en praktische oplossingen voor vraagstukken die leven bij de ondernemers. - Minimaal drie innovatieve projecten, zoals een integrale aanpak voor een biodiversere polder, een aanpak voor innovatieve aanbesteding voor eigentijds grondeigendom en het uitwerken van een natuurinclusief teeltplan voor de boeren dat zorgt voor teelt- en keteninnovaties.	Momenteel wordt er met een kerngroep van boeren de plannen voorbereid. In principe zijn zij de "opdrachtgevers" aan een aantal experts op het vakgebied van natuurinclusieve landbouw en landschap. Vervolgens gaat de lokale participatie van start met de regio. Daarnaast wordt met de Port of Antwerp (PoA) verken of gezamenlijk/grensoverschrijdend het landbouw innovatiefonds kan worden uitgezet.	Conform planning. De komende periode wordt met name beroep gedaan op de middelen uit de Regio Deal.	Voor het innovatieve project Natuurinclusief Zeeuws Bouwplan zijn we afhankelijk van de landbouwseizoenen. Hoogstwaarschijnlijk loopt dit iets over de planning heen om het oogstseizoen te kunnen afronden.	Er zijn diverse risico's gesignaleerd. Met name op het gebied van samenwerking levert dit mogelijk tegenslagen op. Zo is bijvoorbeeld de bereidheid tot participeren in sommige gebieden laag en kan mogelijk het innovatiefonds niet grensoverschrijdend worden ingevuld. Alle zeilen worden bijgezet om negatieve consequenties voor het project te voorkomen.	Alle drie de innovatieve projecten zijn gestart en worden met de agrarische community afgestemd, uitgewerkt en uitgerold. Voor het Natuurinclusief Zeeuws Bouwplan is geregeld dat er circa 70 hectare rullgrond kan worden ingezet als pasmunt. Dit werkt zeer stimulerend op de deelname van de boeren in de deelgebieden. De meeste beschikbare hectares liggen in gebied 1 (Emmadorp). Daar is de animo voor deelname dan ook groot. Teeltplan met maatregelen wordt uitgewerkt. Dit plan wordt door de boeren zelf ontwikkeld en is daarmee een voorbeeld voor het programma 'Zeeuwen zelf aan zet'. Voor de korte keten is een plan van aanpak gemaakt. Een expert gaat aan de slag voor 10 innovatieve boeren, opzoek naar de verbindingen in de keten. Een groep vertegenwoordigers hebben een bezoek gebracht aan een lokale mouterij om te verkennen of er meer lokaal graan kan worden ingezet. Van de mogelijkheden en kansen is door de groep een visualisatie gemaakt.	€ 500.000	€ 500.000	


13. Masteropleiding vitaliteit	Opstartfase.	- Een startklare éénjarige professional masteropleiding Vitality voor studenten van binnen en buiten Zeeland om daarmee het human capital in de regio te versterken. - (tenminste) twee living labs "Vitale Regio" in Zeeuws-Vlaanderen. - Een adviesraad Vitality met stakeholders vanuit gebruikers, ondernemers en overheid. - Een wetenschappelijke adviesraad.	In de periode april – oktober 2021 is allereerst uitvoering gegeven aan het invullen van de benodigde projectorganisatie ten behoeve van de ontwikkeling van de Masteropleiding Vitality. De procedure Macro Doelmatigheidstoets en Toets Nieuwe Opleidingen (ten behoeve van de accreditatie van de opleiding) is ontwikkeld en het tijdsplan afgestemd met betrokkenen.	Conform planning.	Conform planning.	Het finaliseren van de MDT en TNO.	€	950.000	€	950.000	Projectorganisatie geeft namen door van contactpersonen die van dienst kunnen zijn bij de opzet van livinglabs in Terneuzen gericht op stedelijkheid, duurzaamheid en leefomgeving. Is inmiddels afgerond.	
14. Talenten aan de slag in Zeeland	Opstartfase.	Opzetten van een koepelorganisatie waarin samen met stakeholders gewerkt wordt aan enerzijds het versterken van het Zeeuws imago en anderzijds aan het aantrekken van nieuwe vestigers (wonen, werken, studeren, leven), ondernemers en toeristen.	VNO-NCW heeft subsidie ontvangen om het project Talenten aan de slag verder in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot een eerste opzet van een fiche. Deze wordt afgestemd met de deskundigen vanuit de arbeidsmarktregio en de Provincie Zeeland	Conform planning. Talenten aan de slag heeft slechts een beperkt gedeelte van het subsidiebedrag ontvangen.	Het definitieve project ontwerp dient spoedig rond te komen. Provincie Zeeland, Arbeidsmarktregio, VNO-NCW en team Regio Deal blijven hier over in overleg.	Het concept projectontwerp dient nog concreter te worden gemaakt, daarnaast dienen diverse stakeholders hiermee akkoord te zijn. Het project ontwerp heeft de opzet van een projectenportefeuille, deze projecten zijn nog niet geconcretiseerd en is vraag afhankelijk. Daarmee is het niet zeker wanneer de middelen uit de Regio Deal benodigd zijn.	€	100.000	€	25.000	Projectorganisatie reageert op het plan in samenspraak met arbeidsmarktregio en provincie Zeeland.	
15. Expat Center Zeeland	In uitvoering.	Een Zeeland-breed werkend Expat Center, waarin grensoverschrijdend wordt samengewerkt met het Grensinformatiepunt Scheldemond.	Er is een stakeholder analyse gemaakt ten behoeve van de presentatie voor de Zeeuwse gemeenten. Hiermee kan draagvlak worden gerealiseerd bij de gemeenten.	Conform planning	Conform planning.	Deelname van andere overheden kan vertraging opleveren. Heel Zeeland is nodig voor een succesvol Expat Center. Alle opties om draagvlak te creëren worden hiervoor in kaart gebracht en gebruikt.	Een onderdeel van het Expat Centrum Zeeland is de oprichting van de Internationale Community voor heel Zeeland om internationals en (binnenlandse) nieuwvestigsters onder elkaar te laten netwerken en om een soepele integratie in en naar Zeeland te bevorderen. Het eerste fysieke evenement is in voorbereiding en gepland op 5 februari 2022.	€	400.000	€	400.000	
16. Een arbeidsmarkt voor iedereen	In uitvoering.	Een ontwikkelde aanpak om de kwetsbare werkzoekende met arbeidspotentieel een kans te bieden met regulier werk als ultiem doel in kansrijke sectoren in Zeeland, zoals logistiek en land- en tuinbouw.	Binnen het thema werfkit maken zijn er inmiddels 60 mensen werfkit gemaakt, daarnaast zijn er 169 werkzoekenden aan een baan geholpen.	Conform planning.	Conform planning.	Conform planning.	Zie stand van zaken.	€	800.000	€	800.000	
17. Max Mobiel	Opstartfase.	Vervoer van minimaal 40 personen van Gent naar North Sea Port District Terneuzen met als gevolg een betere vervulling vacatures in het North Sea Port District Terneuzen.	Er is vanuit gemeente Terneuzen, North Sea Port en Max Mobiel een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vraag van hetconcept Max Mobiel vanuit bedrijven en grenswerkers. Hieruit komt naar voren dat er onvoldoende vraag is voor collectief vervoer van werknemers over de grens. Dit houdt in dat het project niet wordt voortgezet.	Een gedeelte van de beschikbare Regio Deal middelen valt vrij. Een vervangend project wordt gezocht.	Project wordt afgerond en is geen onderdeel meer van de Regio Deal.	n.v.t.	De vraag naar het concept Max Mobiel is duidelijk geworden. Helaas is deze niet aanwezig. Project gaat niet door. Er volgt een vervangend project.	€	140.000	€	18.150	Max Mobiel is geen onderdeel meer van de Regio Deal. Alexander Buyck dient een verzoek in om de subsidie af te handelen en vast te stellen.
								€	3.640.000	€	3.343.150	
								€	7.300.000	€	6.608.150	
VAT kosten								€	200.000	€	200.000	
								€	7.500.000	€	6.808.150	
										€	691.850	

									€	2.300.000	€	2.300.000		
Voorzieningen innovatief Dichterbij														
8.	Proeftuin recht in Zeeland	In uitvoering.	Een stelsel voor sociaaljuridische ondersteuning voor individuen en MKB. Realisatie van digitale en telefonische juridische hulpverlening. Fysieke mobiele bediening van Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van sociaaljuridische ondersteuning.	In de afgelopen periode is overgegaan van voorbereidingsfase naar de eerste fase van experimenten en leren. Hierin worden zaken daadwerkelijk behandeld en wordt geprobeerd om tot goede oplossingen te komen voor rechtzoekenden.	Minder uitgaven door vertraging in de opstartfase onder meer door corona.	Conform planning.	Risico is dat men vertrekt zonder beeld over het toekomstig businessmodel van Recht in Zeeland. Dit maakt dat het lastig is om te vertellen wat men doet en overheden/stakeholders mee te krijgen in het verhaal. Daarnaast is het ontbreken van de cofinanciering een aandachtspunt.	Er zijn twee cycli van 6 weken doorlopen in het kader van sociaal juridische dienstverlening en fysieke mobiele bediening. Deze twee cycli zijn geëvalueerd. Een derde cyclus is gaande.	€	500.000	€	500.000	Het projectteam maakt een vervolg afspraak met het project waarin we ons gaan focussen op het toekomstig businessmodel en de cofinanciering.	
9.	Pilot geen label toch hulp	In uitvoering.	Het ontwikkelen en uitvoeren van een zorgprogramma dat eenzaamheid bij jongeren vroegtijdig aanpakt waardoor ernstige gevolgen van eenzaamheid zoals verslaving, depressie en suicide voorkomen worden.	Het programma is helaas nog niet gestart vanwege het achterblijvende aantal deelnemers. Het Join-us programma is hier een beperking omdat de doelgroep voor het programma sterk is afgebakend. Jongeren die men in het vizier had, konden daardoor niet mee doen binnen het programma.	Conform planning.	Zie korte stand van zaken.	Niet vinden van deelnemers. Vanuit de Zorgboerderij en stichting Hulst voor elkaar worden nu diverse communicatiemiddelen opgezet om de doelgroep te benaderen.	Er is een samenwerking met Hulst voor elkaar, de cursus methodiek van Join-us is behaald, de eerste aanmeldingen zijn binnengekomen (3 -> nog één aanmelding benodigd) en de locatie is startklaar.	€	100.000	€	100.000		
10.	Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen	In uitvoering.	Het herstructureren van een zorglocatie in Oostburg. Hierbij worden integraal, toekomstgericht en in samenhang met de in de directe omgeving de bestaande voorzieningen, zoals supermarkten en andere winkels samengevoegd.	Opdracht is verstrekt voor de verkenning West Zeeuws-Vlaanderen. Verkenning is het handvat voor besluitvorming begin 2022. Nu in ontwikkeling is een procesvoorstel voor participatie in samenwerking met RIVM, GGD en medewerkers burgerparticipatie. Daarin wordt de processtap meegenomen om inwoners zelf na te laten denken over hun rol.	conform planning	Go/no-go is afhankelijk van besluitvorming van de raad van gemeente Sluis begin 2022.	In deze fase nog beperkt risico. Besluit van raad is bepalend.	Proces participatie zoals voorzien: Betrekken van stakeholders, onderzoek RIVM naar wegingskader inwoners is samenwerking met GGD Zeeland. Capaciteit ten behoeve van onderzoek bleek knelpunt. Klankbordgroep is ingericht waarin de volgende partijen zitting hebben: Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling, de Vereniging van Vastgoed Eigenaren Eenhoornstad (= Oostburg), CZ zorgkantoor, Bestuur Gezondheidscentrum, Ministerie VWS, RIVM, Provincie Zeeland, Woonged Zeeuws-Vlaanderen en Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.	€	500.000	€	75.000	Project en Regio Deal bekijken samen de opzet van het raadsvoorstel om te beoordelen of er zaken tegenstrijdig zijn.	
									€	1.100.000	€	675.000		
Arbeidsmarkt en scholing sterk verbonden														
11.	Kraamkamer vernieuwing basisonderw	In uitvoering.	Een Euregionale samenwerking voor opvang en onderwijs aan beide zijden van de grens gebaseerd op de wensen van de lokale samenleving, te beginnen bij dorpen waar de grens doorheen loopt of op korte afstand van de grens.	De kraamkamer loopt. Voor het creëren van een level-playing field wordt gezocht naar ingangen in Vlaanderen. De doelen van de verschillende landen zijn nog niet aan elkaar gelijk. Voor de lobby richting Rijk wordt een traject voorgesteld met pilot locaties. Hierover dient nog overleg plaats te vinden.	Vanuit het project is een voorstel gedaan tot wijziging van de begroting. Gezien de aard van de voorstellen worden deze in overleg met het Rijk verder verkend. Daarna wordt definitieve besluitvorming voorbereid over de voorstellen.	De doelen vanuit de Regio Deal worden binnen de looptijd van de deal behaald. Door projectverlenging kunnen de beschikbare middelen maximaal worden benut.	Het ontbreekt op dit moment aan een visie op samenwerking vanuit de Belgische partners. Daarnaast is het vinden van een meetinstrument voor kwaliteitsmeting lastig.		€	1.000.000	€	1.000.000	Het op 11 november 2021 geplande overleg met OCW, LNV, gemeenten en projectorganisatie over de opzet van het project en de onderdelen waarop we elkaar kunnen versterken is niet doorgegaan. Gepland wordt digitale bijeenkomst in januari.	
12.	Zorghuis van de toekomst	Opstartfase.	Ingerichte fysieke omgeving waar de triple helix kan samenwerken aan de zorg van de toekomst, met een focus op digitale hulpmiddelen.	In de periode april tot en met oktober 2021 hebben drie werksessies plaats gevonden, die geleid hebben tot een visiedocument dat in concept gereed is. In dit concept visiedocument is de visie op de doorlopende leerlijn en het concept zorgvoorziening van de toekomst beschreven.	Conform begroting, voornamelijk personele kosten.	De doelen vanuit de Regio Deal worden binnen de looptijd van de deal behaald. Door projectverlenging kunnen de beschikbare middelen maximaal worden benut.	Het risico zit in de samenwerking.	Samenwerking tussen zorg en onderwijs is van start en is uitgemond in een gezamenlijk projectplan.	€	250.000	€	150.000	Onderdelen bekijken, zeker hybride leeromgeving. Financieel overzicht wordt ingediend richting november 2021.	

Bijlage 2: Financiële voortgang Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen 'Zeeuwen zelf aan zet'

Besteding Regio Deal


In 2020 heeft Gemeente Terneuzen positief besloten over alle projecten uit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Drie projecten hebben een opstartsubsidie ontvangen, één project heeft minder subsidie aangevraagd en één project heeft meer subsidie ontvangen dan vooraf geraamd. De overige projecten hebben subsidie ontvangen conform bestedingsplan. We hebben het Rijk reeds eerder geïnformeerd over de afwijking binnen lijn 1. Dit wordt binnen de looptijd van de Regio Deal in de afspraken gewijzigd.

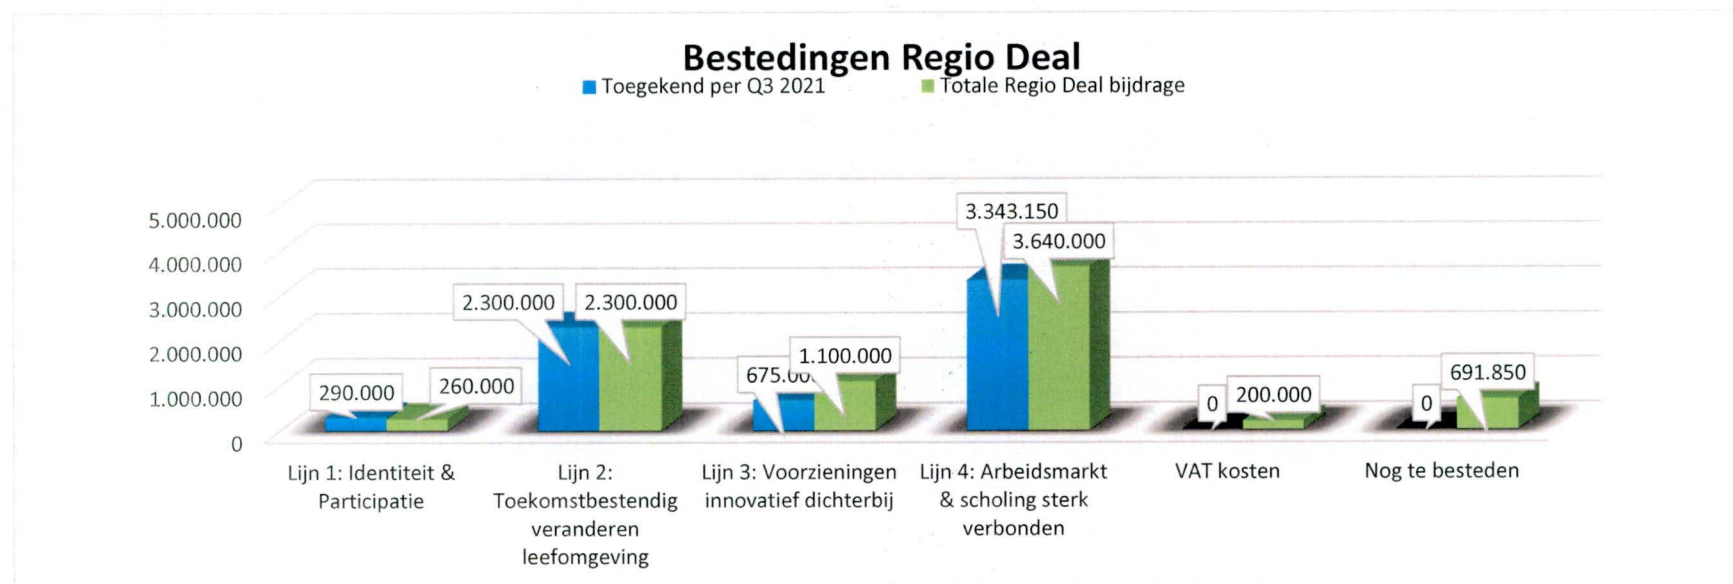

De resterende middelen bestaan uit de gereserveerde middelen voor Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen en Talenten aan de Slag in Zeeland (€ 500.000). Het restant is beschikbaar voor een project binnen lijn 4.

Cofinanciering

Bij totstandkoming van de Deal was er een bijdrage vanuit de regio gepland van € 7,7 miljoen. In de subsidiebeschikking is voor € 7,5 miljoen vastgelegd. De verwachting is dat de totale cofinanciering vanuit de regionale overheden sluit op circa € 8,5 miljoen.

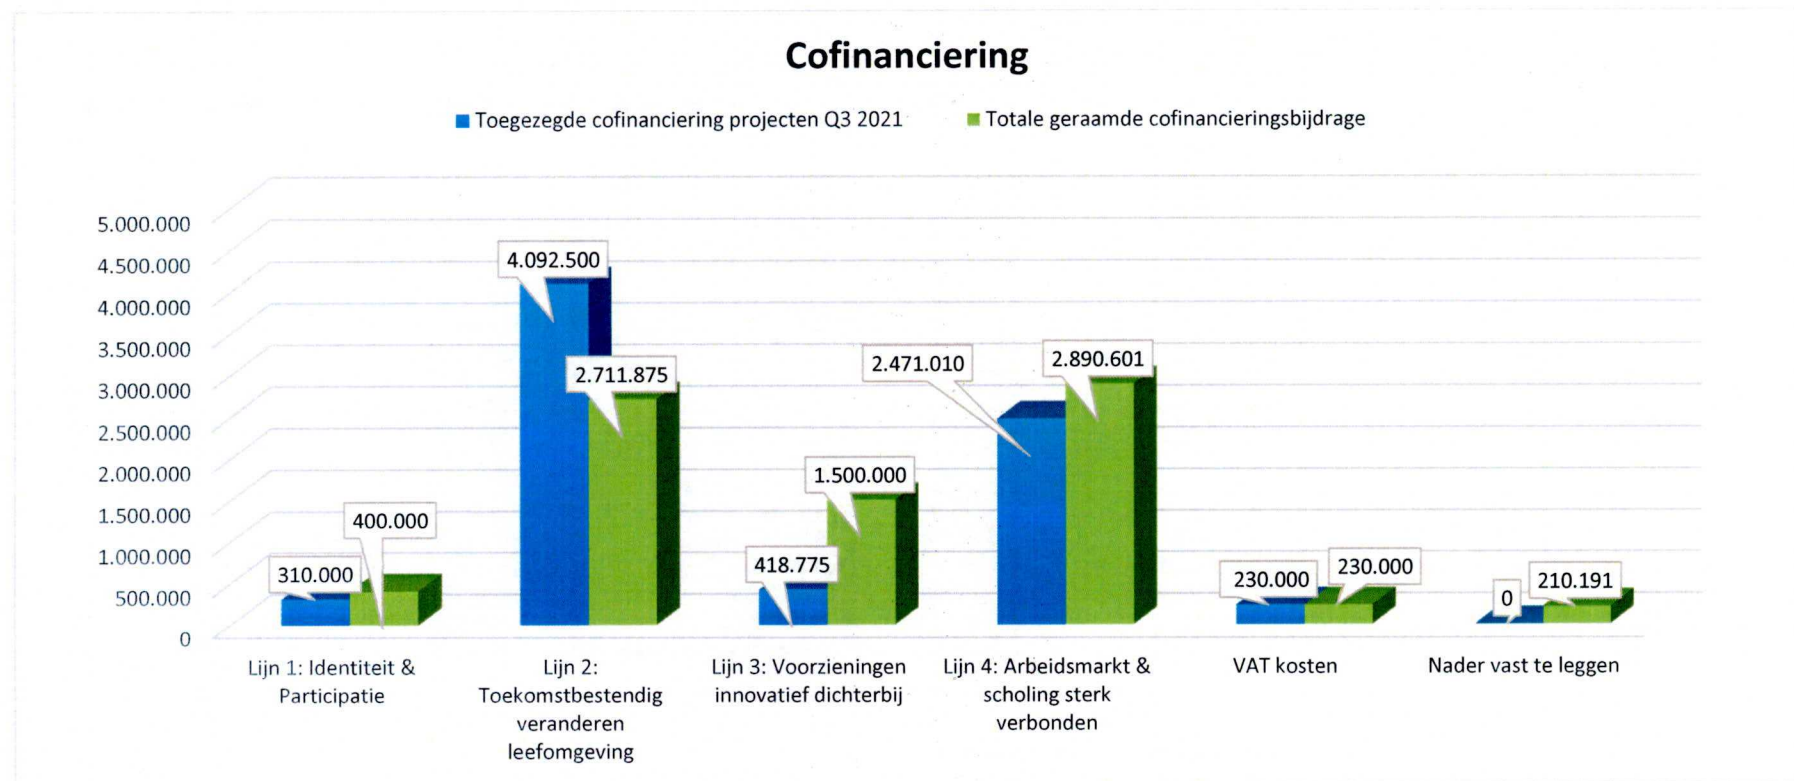

Totale investering in de regio

Om de totale investering te laten zien, worden de tot op heden gemaakte kosten vergeleken met de totaal geraamde investering. Dit geeft de financiële voortgang weer. De totaal geraamde investering van alle gesubsidieerde projecten is per oktober € 19,6 miljoen. Dit is exclusief de investeringen die voortvloeien uit de beschikbare middelen (inclusief die voor talenten aan de slag in Zeeland en Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen). Vanuit de projecten was er tot 31 september 2021 circa € 2,5 miljoen geïnvesteerd.

Totale investering in de regio, geraamd en gerealiseerd

